

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA (GANTT)

Prova de conceito (parser) — concluída em:

26/8/2026

Demonstrado como v1 na Rodada 1 (08/09/2026)

Sprint 1 (Fases 1-4, núcleo) — início:

9/9/2026

Meta: Rodada 2 — 06/10/2026

Sprint 2 (Fase 5-6) — início:

7/10/2026

Meta: Rodada 3 — 10/11/2026

Custo por hora do desenvolvedor (R\$):

R\$ 150,00

Jornada (horas/dia útil):


8

Custo por homem-dia (R\$):

R\$ 1.200,00

ID	Atividade	Responsável	Duração (dias)	Data Início	Data Fim	Predecessora	Custo Total (R\$)	% Concluído	Status	Dias até início	Sprint / Meta
1.1	Parser B-encode (encode/decode)	Felipe	1,0	26/8/2026	27/8/2026		R\$ 1.200,00	100%	Concluído	0	Rodada 1 — planejamento/prova de conceito
1.2.1	– Testes de decodificação (inteiros, strings, lis	Vinicios	0,5	9/9/2026	9/9/2026	1.1	R\$ 600,00	100%	Concluído	14	Sprint 1 — Rodada 2
1.2.2	– Testes de codificação (dicionário → bencode	Vinicios	0,5	9/9/2026	10/9/2026	1.2.1	R\$ 600,00	100%	Concluído	14,5	Sprint 1 — Rodada 2
1.2.3	– Testes de casos de borda	Vinicios	0,5	10/9/2026	10/9/2026	1.2.2	R\$ 600,00	67%	Em andamento	15	Sprint 1 — replanejado para Sprint 2
1.3.1	– Empacotamento/desempacotamento do Han	Carlos Henrique	1,0	10/9/2026	11/9/2026	1.1	R\$ 1.200,00	100%	Concluído	15,5	Sprint 1 — Rodada 2
1.3.2	– Empacotamento/desempacotamento de HA\	Carlos Henrique	1,0	11/9/2026	12/9/2026	1.3.1	R\$ 1.200,00	100%	Concluído	16,5	Sprint 1 — Rodada 2
1.3.3	– Empacotamento/desempacotamento de REC	Carlos Henrique	1,0	12/9/2026	13/9/2026	1.3.2	R\$ 1.200,00	100%	Concluído	17,5	Sprint 1 — Rodada 2
2.1.1	– Definir mecanismo de autorização (lista de peer_id permitidos)		0,5	13/9/2026	14/9/2026		R\$ 600,00	0%	Não iniciado	18,5	Sprint 1 — replanejado para Sprint 2
2.1.2	– Implementar verificação de autorização no Tracker		1,0	14/9/2026	15/9/2026	2.1.1	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	19	Sprint 1 — replanejado para Sprint 2
2.1.3	– Testes de rejeição de cliente não autorizado		0,5	15/9/2026	15/9/2026	2.1.2	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	20	Sprint 1 — replanejado para Sprint 2
2.2.1	– Montagem da query string (info_hash, peer_	Felipe	1,0	15/9/2026	16/9/2026	1.1	R\$ 1.200,00	100%	Concluído	20,5	Sprint 1 — Rodada 2
2.2.2	– Cálculo de uploaded/downloaded/left	Luiz Eduardo / Felij	0,5	16/9/2026	17/9/2026	2.2.1	R\$ 600,00	67%	Em andamento	21,5	Sprint 1 — replanejado para Sprint 2
2.2.3	– Testes do announce request	Vinicios / Luiz Edua	0,5	17/9/2026	17/9/2026	2.2.2	R\$ 600,00	75%	Em andamento	22	Sprint 1 — replanejado para Sprint 2
2.3.1	– Tabela info_hash → lista de peers no Tracker	Luiz Eduardo / Carl	1,0	17/9/2026	18/9/2026	2.2.1	R\$ 1.200,00	100%	Concluído	22,5	Sprint 1 — Rodada 2
2.3.2	– Formato JSON de peers (MVP)	Luiz Eduardo	1,0	18/9/2026	19/9/2026	2.3.1	R\$ 1.200,00	100%	Concluído	23,5	Sprint 1 — Rodada 2
2.3.3	– Contadores complete/incomplete	Luiz Eduardo / Carl	0,5	19/9/2026	20/9/2026	2.3.2	R\$ 600,00	100%	Concluído	24,5	Sprint 1 — Rodada 2
2.4.1	– Parsing da resposta JSON	Luiz Eduardo / Felij	0,5	20/9/2026	20/9/2026	2.3.2	R\$ 600,00	100%	Concluído	25	Sprint 1 — Rodada 2
2.4.2	– Extração e tratamento da lista de peers	Luiz Eduardo / Felij	0,5	20/9/2026	21/9/2026	2.4.1	R\$ 600,00	100%	Concluído	25,5	Sprint 1 — Rodada 2
2.4.3	– Tratamento de failure reason	Luiz Eduardo / Felij	0,5	21/9/2026	21/9/2026	2.4.2	R\$ 600,00	75%	Em andamento	26	Sprint 1 — replanejado para Sprint 2
3.1.1	– Envio do handshake	Felipe / Carlos Hen	1,0	21/9/2026	22/9/2026	2.4.2	R\$ 1.200,00	100%	Concluído	26,5	Sprint 1 — Rodada 2
3.1.2	– Validação do info_hash recebido	Felipe / Carlos Hen	0,5	22/9/2026	23/9/2026	3.1.1	R\$ 600,00	100%	Concluído	27,5	Sprint 1 — Rodada 2
3.2.1	– Geração do bitfield local	Felipe / Carlos Hen	1,0	23/9/2026	24/9/2026	3.1.2	R\$ 1.200,00	100%	Concluído	28	Sprint 1 — Rodada 2
3.2.2	– Leitura do bitfield remoto	Felipe / Carlos Hen	0,5	24/9/2026	24/9/2026	3.2.1	R\$ 600,00	100%	Concluído	29	Sprint 1 — Rodada 2
3.3.1	– Envio de INTERESTED	Felipe / Carlos Hen	0,5	24/9/2026	25/9/2026	3.2.2	R\$ 600,00	100%	Concluído	29,5	Sprint 1 — Rodada 2
3.3.2	– Lógica de UNCHOKE (liberação de banda)	Felipe / Carlos Hen	1,0	25/9/2026	26/9/2026	3.3.1	R\$ 1.200,00	100%	Concluído	30	Sprint 1 — Rodada 2
3.4.1	– Envio de REQUEST por bloco (16 KiB)	Felipe	1,0	26/9/2026	27/9/2026	3.3.2	R\$ 1.200,00	100%	Concluído	31	Sprint 1 — Rodada 2
3.4.2	– Recebimento e buffer de PIECE	Felipe	1,0	27/9/2026	28/9/2026	3.4.1	R\$ 1.200,00	100%	Concluído	32	Sprint 1 — Rodada 2
3.4.3	– Controle do loop até completar a peça	Felipe	1,0	28/9/2026	29/9/2026	3.4.2	R\$ 1.200,00	100%	Concluído	33	Sprint 1 — Rodada 2

3.5.1	– Validação de peça completa (hash)	Felipe	1,0	29/9/2026	30/9/2026	3.4.3	R\$ 1.200,00	100%	Concluído	34	Sprint 1 — Rodada 2
3.5.2	– Broadcast de HAVE aos peers		0,5	30/9/2026	30/9/2026	3.5.1	R\$ 600,00	0%	Não iniciado	35	Sprint 1 — replanejado para Sprint 2
4.1.1	– Abertura e manutenção da conexão TCP	Luiz Eduardo / Felipe	1,5	30/9/2026	2/10/2026	3.1.2	R\$ 1.800,00	100%	Concluído	35,5	Sprint 1 — Rodada 2
4.1.2	– Tratamento de timeout/reconexão	Felipe	1,0	2/10/2026	3/10/2026	4.1.1	R\$ 1.200,00	0%	Não iniciado	37	Sprint 1 — replanejado para Sprint 2
4.2.1	– Buffer de peça em memória	Felipe	1,0	3/10/2026	4/10/2026	3.4.2	R\$ 1.200,00	100%	Concluído	38	Sprint 1 — Rodada 2
4.2.2	– Escrita da peça validada no arquivo final	Felipe	1,0	4/10/2026	5/10/2026	4.2.1	R\$ 1.200,00	100%	Concluído	39	Sprint 1 — Rodada 2
4.3.1	– Cálculo de hash SHA-1 por peça	Felipe	0,5	5/10/2026	5/10/2026	4.2.1	R\$ 600,00	100%	Concluído	40	Sprint 1 — Rodada 2
4.3.2	– Comparação com hash esperado e tratamento	Felipe	0,5	5/10/2026	6/10/2026	4.3.1	R\$ 600,00	100%	Concluído	40,5	Sprint 1 — Rodada 2
5.1	Upload de arquivos (fragmentação e catalogação)	Felipe / Luiz Eduardo	3,0	7/10/2026	10/10/2026		R\$ 3.600,00	50%	Em andamento	42	Sprint 2 — Rodada 3
5.2	Distribuição resiliente de fragmentos		3,0	10/10/2026	13/10/2026	5.1	R\$ 3.600,00	0%	Não iniciado	45	Sprint 2 — Rodada 3
5.3	Eleição de um novo Tracker em caso de falha		2,5	13/10/2026	15/10/2026	5.2	R\$ 3.000,00	0%	Não iniciado	48	Sprint 2 — Rodada 3
5.4	Modo de lockdown automático da rede		2,0	15/10/2026	17/10/2026	5.3	R\$ 2.400,00	0%	Não iniciado	50,5	Sprint 2 — Rodada 3
5.5	Gestão de permissões mais granular		1,5	17/10/2026	19/10/2026	5.4	R\$ 1.800,00	0%	Não iniciado	52,5	Sprint 2 — Rodada 3
6.1	Testes de integração	Equipe de desenvolvimento	2,0	19/10/2026	21/10/2026	4.3.2	R\$ 2.400,00	100%	Concluído	54	Antecipado na Rodada 2
6.2	Documentação (README, licença MIT)	Lucio / Lucas	1,0	21/10/2026	22/10/2026	6.1	R\$ 1.200,00	75%	Em andamento	56	Sprint 2 — Rodada 3
6.3	Preparação das apresentações	Lucas / Equipe	1,0	22/10/2026	23/10/2026	6.2	R\$ 1.200,00	67%	Em andamento	57	Sprint 2 — Rodada 3
	TOTAL		44,0				R\$ 52.800,00				

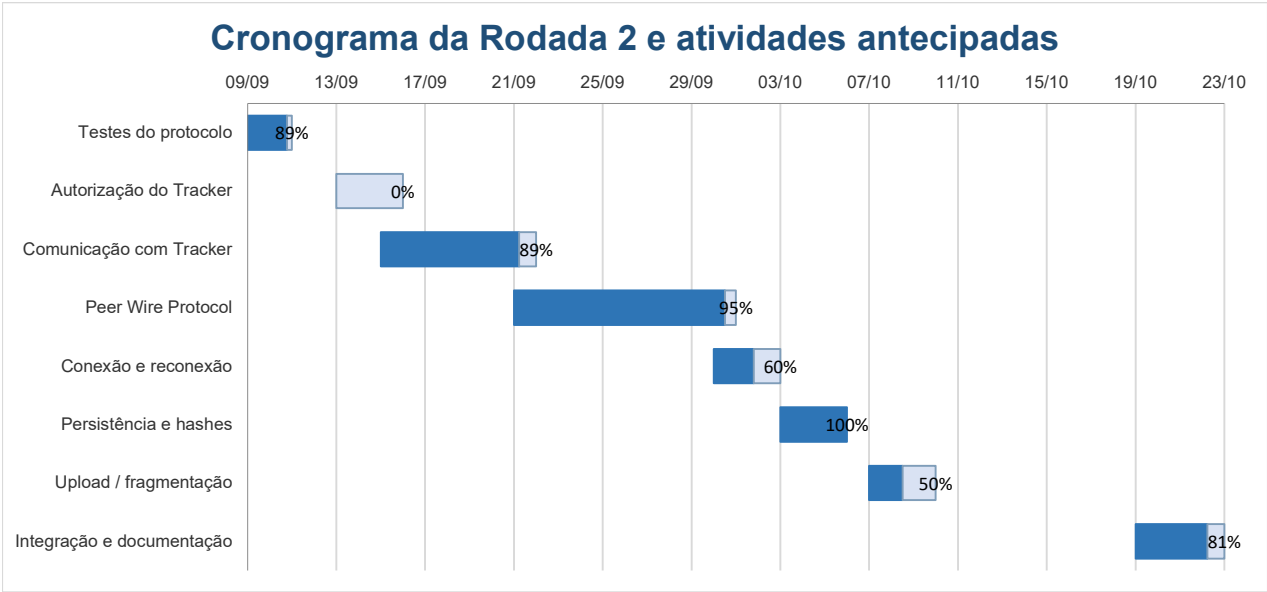

Cronograma completo do projeto por fase

Cronograma completo do projeto por fase

