
BURNDOWN DA RODADA 3

Trabalho restante planejado e estimado no fechamento da versão final.

Data	Restante planejado (h-d)	Restante estimado (h-d)
07/10	15,83	15,83
13/10	13,19	13,60
20/10	10,55	11,20
27/10	7,91	9,00
03/11	5,27	6,40
10/11	2,63	2,80
12/11	0,00	0,00

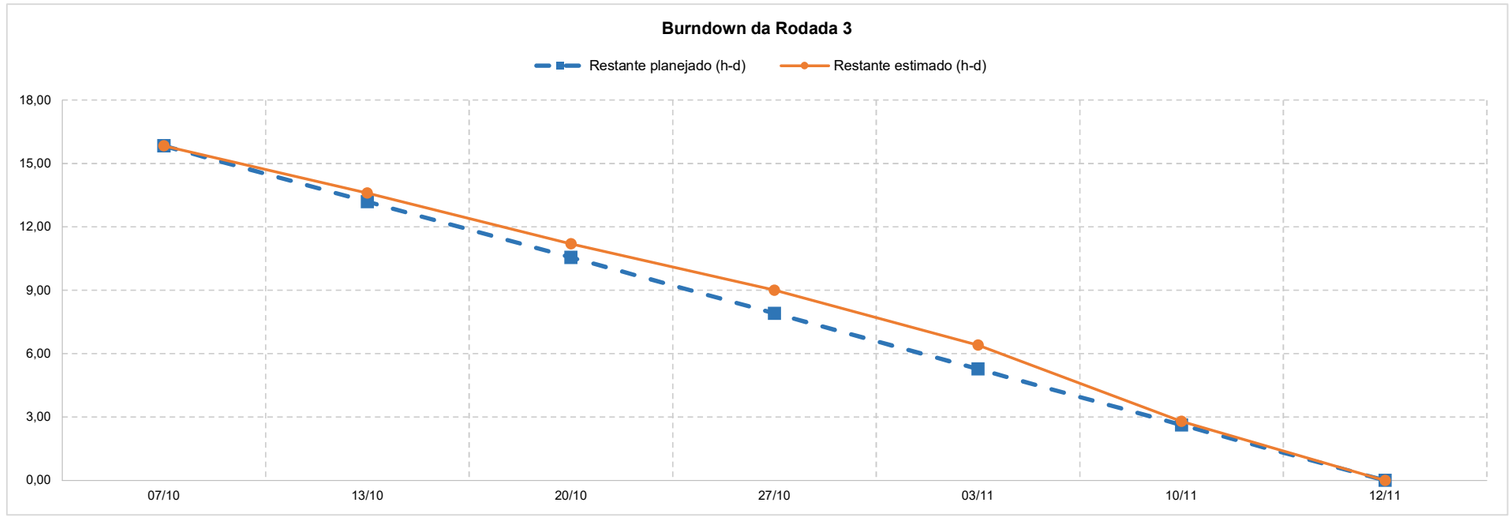

RESULTADO DA RODADA 3

Indicador	Valor	Situação
Escopo líquido inicial	15,83 h-d	Planejado
Trabalho concluído	15,83 h-d	Concluído
Restante final	0,00 h-d	Concluído
Composição do escopo	16,00 + 4,08 − 4,25	Plano da Rodada 3

HISTÓRICO CONSOLIDADO ATÉ A RODADA 3

Iteração	Escopo inicial (h-d)	Restante final (h-d)	Entregue (h-d)	Situação	Registro
Rodada 1	1,00	0,00	1,00	Concluída	Planejamento e prova de conceito
Rodada 2	27,00	4,08	22,92	Concluída com carryover	Monitoramento da segunda iteração
Rodada 3	15,83	0,00	15,83	Concluída	Produto final e fechamento
Projeto	44,00	0,00	44,00	Escopo final concluído	EVM acumulado e controle de mudanças
